Comune di Ripalta Arpina

MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SITA IN VIA CAPITANI DI RIVOLTELLA, 3 - RIPALTA ARPINA (CR)

Committente:

Comune di Ripalta Arpina

Piazza Marconi, 1 - 26010 Ripalta Arpina (CR)

CRONOPROGRAMMA

Allegato: D

Ripalta Arpina 28 marzo 2019

IL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Dott. Ing. Giuseppe Colombi
N. 685 di iscrizione all'Albo
C.F. CLM GPP 57M21 I827Q

Scuola dell'Infanzia comunale - Comune di Ripalta Arpina

28-mar-2019

Studio di Ingegneria Colombi

Responsabile di progetto	
Date di inizio e fine progetto	1-lug-2019 - 28-dic-2019
Completamento	0%
Attività	11
Risorse	0

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Allestimento area di cantiere	01/07/19	07/07/19
Rimozione marciapiede e scavo di fondazione	08/07/19	21/07/19
Rimozione marciapiede e scavo di fondazione lungo il perimetro esterno con esclusione zona porticato; formazione code di rondine e posa perni di ancoraggio fondazione		
Getto opere di fondazione lungo il perimetro esterno con esclusione della zona porticato	22/07/19	04/08/19
Rimozione porte e serramenti, posa ponteggi e piani di sostegno	05/08/19	11/08/19
Rimozione porte e serramenti; posa ponteggi lungo il perimetro esterno dell'edificio e messa in opera dei piani di sostegno dei solai in laterocemento e delle gronde oggetto di demolizione		
Demolizione sottotetto e solai	12/08/19	01/09/19
Rimozione e recupero impianto fotovoltaico; rimozione impianti elettrici a soffitto e messa fuori servizio di tutti gli impianti; rimozione canali e manto di copertura; rimozione canna fumaria; demolizione sottotetto, gronde, solai in laterocemento, cordoli, travi e pilastri in C.A.; rimozione piano di appoggio solai zona centrale e porticato;		
Demolizioni, scavo e getto fondazione pilastri	02/09/19	29/09/19
Demolizione tavolato divisorio; rimozione pavimento interno zona centrale e pavimento porticato; scavo di fondazione porticato e zona centrale; demolizione opere di fondazione porticato; formazione code di rondine; getto opere di fondazione interne ed esterne zona porticato; getto dei pilastri interni ed esterni e dei cordoli in C.A.; riempimento vani di scavo interni; messa in opera dei piani di calpestio nella zona centrale onde consentire la posa del solaio in legno in sicurezza;		
Posa solaio in legno	30/09/19	10/11/19
Posa solaio in legno; verniciatura opere in legno con prodotto atto a conferire la classe 1 di reazione al fuoco; formazione opere di tamponamento dei muri perimetrali;		
Rimozione piani di lavoro	11/11/19	17/11/19
Spostamento vani di accesso alle aule; ripristino murature e intonaci;	18/11/19	01/12/19
Ripristino fognatura acque bianche e nere; riempimento vani di scavo e formazione sottofondi	02/12/19	20/12/19
Rimozione area di cantiere	21/12/19	27/12/19

Diagramma di Gantt

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Allestimento area di cantiere	01/07/19	07/07/19
Rimozione marciapiede e scavo di fondazione	08/07/19	21/07/19
Getto opere di fondazione lungo il perimetro e..	22/07/19	04/08/19
Rimozione porte e serramenti, posa ponteggi e..	05/08/19	11/08/19
Demolizione sottotetto e solai	12/08/19	01/09/19
Demolizioni, scavo e getto fondazione pilastri	02/09/19	29/09/19
Posa solaio in legno	30/09/19	10/11/19
Rimozione piani di lavoro	11/11/19	17/11/19
Spostamento vani di accesso alle aule; ripristin...	18/11/19	01/12/19
Ripristino fognatura acque bianche e nere; rie...	02/12/19	20/12/19
Rimozione area di cantiere	21/12/19	27/12/19

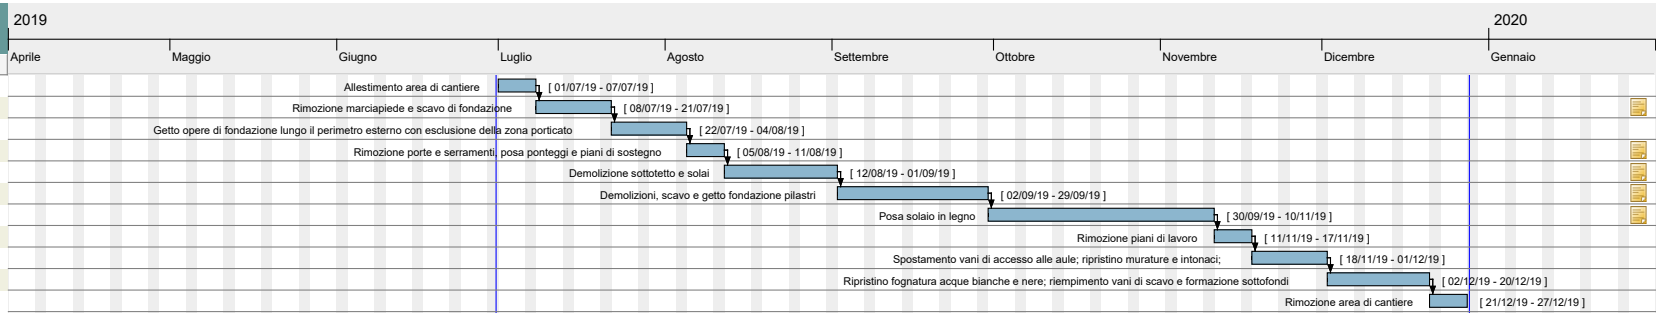


DIAGRAMMA DI GANTT

